


JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS - JUST



Käyttäjän ennakkokatselmointi 1. kerroksen aulan tila-alueelle suoritettiin viikolla 32. (kuva 1).

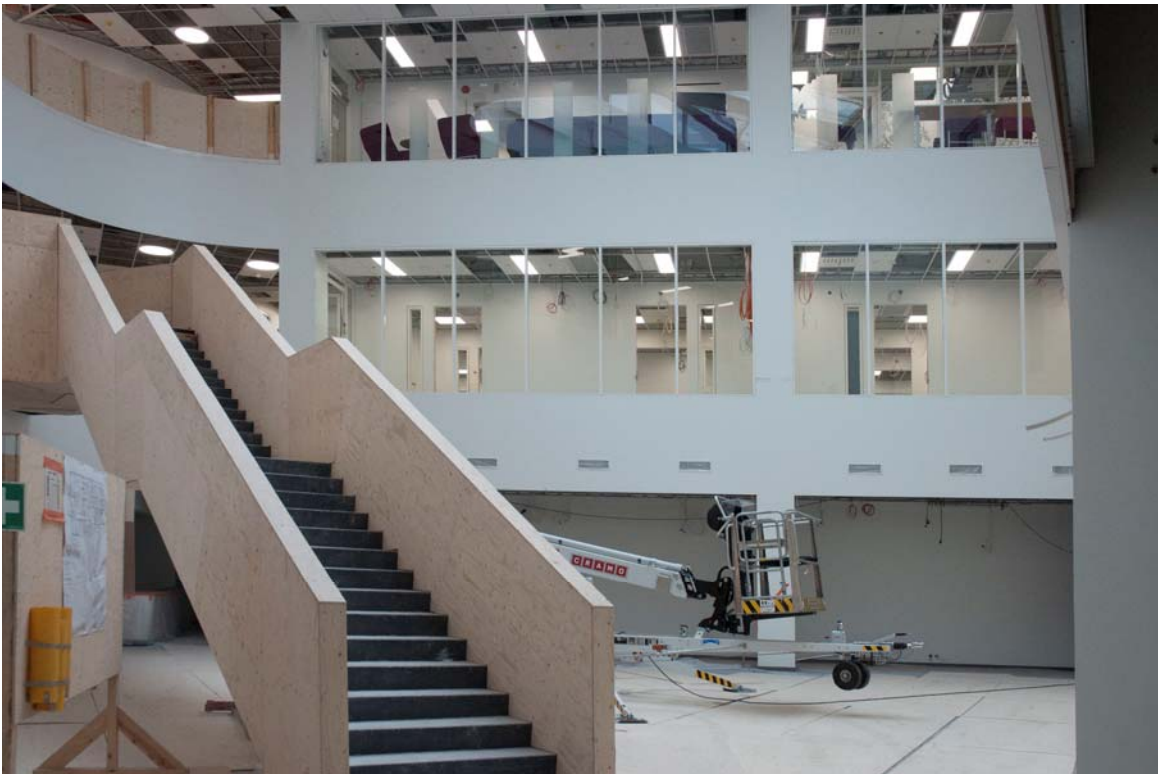

Lattiat on suojattu useassa tilassa rakennustöiden aikana (kuva 2).



Kiintokalusteasennukset ovat valmiit ensimmäistä kerrosta lukuun ottamatta. (kuva 3).



Käyttäjät tutustumassa kalusteratkaisuihin (kuva 4).



NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 32 - 33

- Aluerakennustyöt ovat käynnissä
- Parkkihallin savunpoistojärjestelmää testataan kylmäsavukokeella viikolla 33
- 4. kerroksen alakattojen yläpuolinen siivous on tehty ja alakattoja on alettu ummistaa
- 4. kerroksessa oviaisennukset ovat valmiit ja sähkölukot on asennettuna suureen osaan ovista
- 4. kerroksessa asennetaan märkätilojen ovia
- Suuri osa 4. kerroksen huuhteluhuoneen laiteasennuksista on valmiina
- 4., 3. ja 2. kerroksissa tehdään ilmanvaihtojärjestelmien säätöä
- Sisäoviasennukset on käynnissä toisessa kerroksessa
- Kiintokalusteasennukset ovat valmiit ensimmäistä kerrosta lukuun ottamatta
- Talotekniset asennustyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Epoksilattiatyöt jatkuvat viikolla 33 ensimmäisen kerroksen päivystyksen tila-alueella
- Alakattorunkojen työt ovat käynnissä ensimmäisessä kerroksessa
- Keittiölaitteiden asennukset ovat käynnissä
- Käyttäjän ennakkokatselmointi 1. kerroksen aulan tila-alueelle suoritettiin viikolla 32.
- Käyttäjän laatukatselmoinnit suoritetaan 2. kerroksen avosairaanhoidon sekä hallinnon tila-alueille viikolla 33.

Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 32 oli 97,0 %.



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja	Jari Toivo	+358 40 749 5920
-----------------------------------	------------	------------------

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja	Tiina Salminen	+358 40 315 2154
--------------------	----------------	------------------

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja	Frej Weurlander	+358 50 367 3251
-----------------	-----------------	------------------

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy	Markus Aaltonen	+358 50 304 6336
--	-----------------	------------------

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy	Mikko Heikkinen	+358 50 305 5496
--	-----------------	------------------

Yksikön johtaja, A-Insinöörit	Timo Leppänen	+358 207 911 810
-------------------------------	---------------	------------------

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.
